



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA
KOTA SURABAYA**

NOTULA RAPAT




HARI : Selasa
TANGGAL : 7 Maret 2023
WAKTU : 10.00 WIB
TEMPAT : Ruang Manajer Logistik
PIMPINAN : Manajer Logistik
ACARA : Rapat Koordinasi Material Pasang Baru

Hasil Rapat:

1. Dimulai bulan maret 2023 untuk material pasang baru menggunakan standart baru yaitu material HDPE (gambar terlampir):
2. Bagian Logistik mengajukan perubahan material pasang baru dengan standart baru yaitu material HDPE ke Bagian TSI;
3. Stock material ball valve pvc uk $\frac{3}{4}$ di gudang sebanyak 2.325 buah dan user pelayanan teknis barat dan timur sepakat untuk memanfaatkan ball valve pv untuk $\frac{3}{4}$ uk pasang baru dengan standart baru sampai stock ball valve pvc $\frac{3}{4}$ habis. Setelah itu berganti dengan gate valve kuningan uk $\frac{3}{4}$;
4. Pipa sney galvanis diganti dengan pipa pe $\frac{3}{4}$ sebanyak 1 (satu) meter;
5. Pada poin 4, ditambahkan pada permintaan pipa penghubung (include);
6. Pemanfaatan aksesoris pasang baru bahan galvanis setelah aksesoris galvanis lengkap.

PESERTA:

No	Nama	Jabatan/Bagian	Tanda tangan
1	Herisa D	Logistik	
2	Agus Subagy	PTT	
3	Andibato	PKD	
4	Fahmi	SPV Zona 5 PTB	
5	M. J. J. J.	SPV Zona 1 PTB	

No	Nama	Jabatan/Bagian	Tanda tangan
6	M. Abdus Somad.M	PTT	
7	Iqwan H	PTB	
8	Pahala S	PTB	
9	Syaifulmuni.A.P	PTB	
10	Moses	PTT	
11	Fajar	LOGISNIK	
12	Teguh	Logistik	
13	Vida	Logistile	
14			
15			
16			
17			

**RENCANA BIAYA PEMASANGAN BARU
SAMBUNGAN RUMAH**

Nama	: ABD. HOLIK	No. Pendaftaran	: T20220004247
Alamat Persil	: Jl. KEDINDING LOR KEMUNING BARU Gang 3 No. 3 C MENGH...GG PERTOLONGAN	No. PA	: / 216
Alamat Pemohon	: KEDINDING LOR III TEMBUSAN 1/15-B	No. Meter	:
Kecamatan	: Kenjeran	Guna Persil	: PERUMAHAN A-2
Kelurahan	: Tanah Kalikeding	Luas Bangunan	: 16 M2
Sub Zona	: 316	Tarif	: 4A

Tekanan	: 0	TGL. 05-07-2022	Alamat
---------	-----	-----------------	--------

Persyaratan :	Copy Surat Tanah / Pernyataan	V	Copy PBB	V	Copy KTP	V
---------------	----------------------------------	---	----------	---	----------	---

Material yang diperlukan

NO	MATERIAL	JML	STN
1	VERLOOP RING Ø 3/4 X 1/2	2	Biji
2	FEMALE ELBOW Ø 3/4 PE	3	Biji
3	PIPA GI Ø 3/4 40 cm	1	Batang
4	PIPA GI Ø 3/4 20 cm	3	Batang
5	Knee GI Ø 3/4	4	Biji
6	Double Nipple Ø 3/4	1	Biji
7	Kopling Ø 1/2	2	Biji
8	Meter air Ø 1/2	1	Biji
9	Tee Ø 3/4 x 3/4	1	Biji
10	Plug PVC Ø 3/4	2	Biji
11	Kawat & Timah Segel	1	Unit
12	Ball Valve PVC 3/4	1	Biji
13	Saddle Clamp PVC 110 x 3/4	1	Biji
14	Elbow Male Off Take (threads/ulir) PE 3/4	1	Biji
15	Rubber Packing 1/2	2	Biji
16	Pipa PE Ø 3/4	4	M

Jumlah Biaya Pemasangan yang harus dibayar

Biaya Sambungan	: Rp.	1.570.000
Biaya Registrasi	: Rp.	4.400
Biaya Sarana Investasi	: Rp.	0
Jumlah	: Rp.	1.574.400
Biaya Operasional	: Rp.	157.440
Total	: Rp.	1.731.840

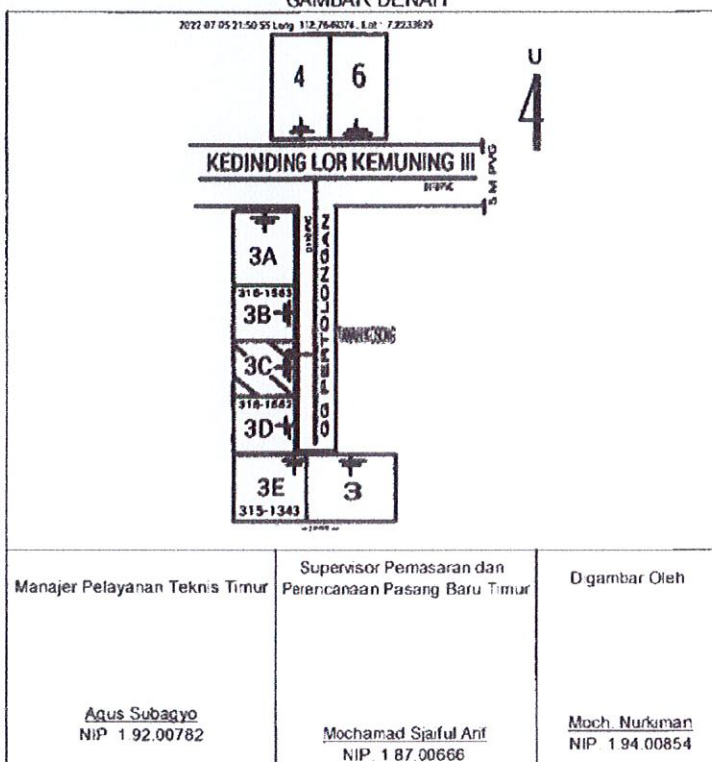
Terbilang : Satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus empat puluh rupiah

Dibayar Tgl	11-07-2022	Ttd
No. TPS		
No. TP		

Telah Dikerjakan Tgl

Petugas Pelaksana	Pengawas	Mengetahui Pelanggan

GAMBAR DENAH



Material telah diterima oleh :
Ttd

Dilayani oleh :
Ttd

Mengetahui

Manajer Pelayanan Teknis Timur

CP. 087754125995
